

**PERÚ****Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo****Secretaría
General****Dirección General
de Administración**

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"


INFORME N° 048-2014-MINCETUR/SG/OGA-OASA-SDSS

A : **Abg. JENNY MARGOT ARBILDO ESTRELLA**
Directora de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares

ASUNTO : SEGUNDO INFORME MENSUAL DE LA SUPERVISIÓN DE
EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA CAPILLA SEDE CENTRAL
MINCETUR-PRODUCE

REFERENCIA : Contrato N°013-2014-MINCETUR/SG/OGA
AMC N°130-2013-MINCETUR/CE

FECHA : San Isidro, 15 de Mayo de 2014

**ANTECEDENTES**

Con fecha 20/01/2014 se firma el contrato N° 013-2014-MINCETUR/SG/OGA, correspondiente a la contratación de la supervisión de obra de la nueva capilla de la Sede Central MINCETUR-PRODUCE.

Con fecha 18 de Marzo se firma el acta de entrega de terreno, marchando como fecha de inicio de obra el día 19 de marzo de 2014.

Con fecha 04 de Abril el Ing. Segundo Kcam Chung hace llegar mediante carta N° 024-2014-SKCH/SUP el informe Mensual N°01-Marzo 2014.

Con fecha 05 de mayo el Ing. Segundo Kcam Chung hace llegar mediante carta N° 030-2014-SKCH/SUP el informe Mensual N°02-Marzo 2014.

Con fecha 12 de mayo del 2014 se remite carta N°044-2014-MINCETUR/SG/OGA-OASA al Ing. Ing. Segundo Kcam Chung, donde se comunica observación efectuada por la Municipalidad de San Isidro

ANALISIS

Se procedió a realizar la revisión del informe alcanzado, el mismo que comprende el informe sobre los avances de la ejecución de obra nueva capilla de la Sede Central MINCETUR-PRODUCE durante el mes de Abril de 2014.

De la revisión del informe se verifica que la entrega se ha realizado dentro de los plazos fijados encontrándose conforme a lo solicitado en al AMC N° 130-2013-MINCETUR/CE.

Así mismo se comunica que el avance de obra se encuentra dentro de lo programado, observándose un ligero adelanto de acuerdo al cronograma avance de obra.

Sin embargo es pertinente indicar que en la carta N°044-2014-MINCETUR/SG/OGA-OASA, se observa la ausencia del Supervisor de obra el día 28 de abril del 2014, vulnerando la clausula Decimo Tercera del Contrato a la permanencia en obra, debiéndosele considerar la penalidad correspondiente

CONCLUSIONES

Considerando lo antes expuesto se remite en original a fin de que se defina el monto de penalidad correspondiente y se continúe su trámite de pago.

Atentamente,

Lic. NELLY SILVA MARTINEZ
Sub-Director de Servicios y Seguridad

MINCETUR

NSM/rcm

Expediente N° 794442





Municipalidad
de
San Isidro

"Año de la Promoción de la industria Responsable y del Compromiso Climático"

San Isidro, 29 de abril de 2014

OFICIO N° 2550-14-12.1.0-SOP-GACU/MSI

Señores:

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Ca. Uno Oeste N° 50, Urb. Corpac.

San Isidro

De mi consideración:

Referencia: Expediente N° 318512

Por medio del presente tengo a bien dirigirme a Usted, en relación al expediente de la referencia el cual cuenta con Resolución de Licencia de Edificación N° 130-14, para la Ampliación y Remodelación Modalidad A del predio ubicado en la Calle Uno Osete N° 50, Urb. Corpac, distrito de San Isidro.

Sobre el particular con fecha 28 de abril del presente se ha efectuado visita de Verificación Técnica de oficio, contenida en el Informe N° 228-2014-12.1.0-VT-SOP-GACU/MSI-GJAS, emitido por el Arquitecto Guillermo Jesús Amico Serrano, Supervisor de Obra; constatando lo siguiente:

1. Avance de Obra = 50%. Se han concluido los vacados de elementos verticales de concreto.
2. Ausente el nuevo Responsable de Obra, con anexo "E" del 07/04/2014, el Ingeniero Edson Kreisler Crucinta Gonzales, con C.I.P. 58, 611.

Respecto a la falta del responsable de obra durante la visita de inspección se le da a conocer que la ejecución de la Obra se debe de realizar bajo la dirección del responsable de obra designado, quien se asegurará que ésta se realice conforme al proyecto aprobado y cumpla con lo normado en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

En caso de que el responsable de obra no pueda asumir sus funciones deberá de presentar carta de desistimiento y presentación del nuevo responsable de obra. Que según el Decreto de Alcaldía N° 002-ALC/MSI del 19/01/2012: "Parámetros, Urbanísticos y Edificatorios", en el Capítulo V, de las Medidas en Seguridad de Obra, art. 23, inc. e): A fin de garantizar la seguridad de las obras de edificación se dispone que el Profesional Responsable de Obra, deba permanecer en la obra durante el horario de trabajo en la edificación o durante el horario extendido según sea el caso, en consecuencia un profesional no puede ser responsable de varias obras a la vez.

Las observaciones citadas deberán ser atendidas en forma inmediata, a fin de garantizar que los procedimientos empleados aseguren el mínimo de riesgos para los trabajadores de la obra y para los predios vecinos y sus ocupantes. Cabe precisar que de no cumplir con subsanar las observaciones, puede incurrirle en multa y la paralización de la obra, conforme con lo establecido en la Tabla de Infracciones, Sanciones Administrativas y Medidas Complementarias (TISAMC) de la Municipalidad de San Isidro.

Por lo expuesto se le otorga un (01) día de plazo a fin de cumplir con el levantamiento de observaciones, asimismo se remite a la Gerencia de Fiscalización – Subgerencia de Inspecciones, copia de los actuados para las acciones que corresponda de acuerdo a su competencia.

Sin otro particular, quedo de usted

Atentamente,

7937

EXPEDIENTE N° 794748
DERIVAR
OPER ☐ OASA ☒ OAF ☐
OCP ☐ OTDyA ☐ MRA ☐
UNIDAD ORGÁNICA:
Trámite - Ejecución ☐
Proy. Oficio / Resol. ☐
Informe / Opinión ☒
Copia Informativa ☐
Coordinar con DG ☐
Consolidar Información ☐
Archivo ☐
URGENTE ☐
REVISAR ☐
OBSERVACIONES
Fecha: / /
Firma: <i>[Firma]</i>
Director General de Administración
Subgerencia de Obras Privadas

MPQP/gjas

Recibido por:

Nombre y Apellido

DNI:

Firma:

MINCETUR - OTDA

EXP: 794748

FECHA: 06/05/2014 HORA: 03:28:22

RECIBIDO POR: vnino

REVISAR TU TRAMITE EN NUESTRO PORTAL:
WWW.MINCETUR.GOB.PE

Forma de Recepción:

Vincular

Subgerencia de Obras Privadas

EXPEDIENTE N°
DERIVAR SDPCP ☒ SGA ☐
SDSS ☒ SUP. M. ☐ SUP. S. ☐
SUP. C. ☐ SEACE ☐ C. EXP. ☐
OTRO:
Trámite - Ejecución
Proy. Memo / Resol.
Informe / Opinión
Para Conocimiento
Coordinemos
Hacer Seguimiento
Cotizar
Archivo
URGENTE
OBSERVACIONES
Fecha:



**PERÚ****Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo****Secretaría
General****Dirección General
de Administración**

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

MEMORANDUM N° 639 -2014-MINCETUR/SG/OGA-OASA

A : **SRA. NELLY SILVA MARTINEZ**
Sub Directora de Servicios y Seguridad

ASUNTO : Conformidad del Informe Mensual N° 02 – Abril 2014

REFERENCIA : Carta N° 030-2014-SKCH/SUP de fecha 05.05.2014


FECHA : San Isidro, **07 MAYO 2014**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual, el Ing. SEGUNDO URBANO KCAM CHUNG, remite el Informe Mensual N° 02 – Abril 2014, entregable del servicio derivado del Contrato N° 013-2014-MINCETUR/SG/OGA, de la AMC N° 130-2013-MINCETUR/CE – "Servicio de supervisión de la obra Nueva Capilla de la Sede Central del MINCETUR – PRODUCE".

Sobre el particular, es preciso informar que en la cláusula novena del contrato, se estableció que la conformidad será otorgada por la Oficina General de Administración previo informe de su despacho, por lo que es necesaria su opinión sobre el entregable presentado por el contratista.

En ese sentido, se remite el referido entregable, a fin de que emita la opinión correspondiente. Cabe precisar que en atención a lo señalado en la cláusula undécima del contrato, en concordancia con el Art. 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la conformidad o las observaciones al entregable, debe de realizarse dentro de los diez (10) días calendarios, contados a partir de su recepción por parte de la Entidad.

Atentamente,


JENNY M. ARBILDO ESTRELLA
Directora de Abastecimiento y Serv. Auxiliares
MINCETUR

Carta N° 029-2014-SKCH/SUP

Lima, 05 de Mayo del 2014

Señor

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO-MINCETUR
Presente.-

Atención : Dirección General de Administración

Asunto : **Informe Valorización Mensual N° 02 – Abril 2014**

Referencia : Adjudicación de Menor Cuantía N° 0130-2013-MINCETUR/CE
Contratación del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra: "NUEVA CAPILLA DE LA SEDE CENTRAL DEL MINCETUR - PRODUCE

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a Uds. con la finalidad de adjuntarle el **Informe de Valorización Mensual N° 02** correspondiente al mes de abril del 2014 en original y 02 copias, conforme a la Cláusula Quinta del Contrato N° 013-2014-MINCETUR/SG/OGA.

Luego del procesamiento correspondiente al presente mes, con los metrados revisados conjuntamente con el contratista, se obtiene la suma de SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTISIETE CON 75/100 NUEVOS SOLES (S/.60,647.75) a favor del contratista, incluido el IGV.

Sin otro particular, quedo de Uds.

Atentamente,



SEGUNDO URBANO KCAM CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP N° 31337

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO MINCETUR

INFORME VALORIZACION N° 02 **ABRIL 2014**



MES DE ABRIL DE 2014

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : POR CONTRATA

EJECUTA : MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

ING. SUPERVISOR : SEGUNDO URBANO KCAM CHUNG

ING. RESIDENTE : EDSON K. CRUCINTA GONZALES

DEPARTAMENTO : LIMA

PROVINCIA : LIMA

DISTRITO : SAN ISIDRO

05 DE MAYO DE 2014

ÍNDICE

1.1	Carátula	1
1.2	Índice	2
1.1	Datos Generales	3
1.2	Memoria Descriptiva	4
1.3	Objetivo del Proyecto	4
1.4	Descripción del Proyecto	5
1.5	Trabajos Ejecutados	5
1.7	Cuadro Resumen de Valorización	5
1.8	Avance de Obra	6
1.9	Avance Financiero	7
1.10	Garantías	
1.10.1	Garantía Fiel Cumplimiento	7
1.10.2	Garantía Adelanto Directo	7
1.10.3	Garantía para Adelanto de Materiales	7
1.11	Conclusiones y Recomendaciones	7
1.12	Valorización de Obra N° 02	9 - 18
1.13	Documentación del Contratista	19 - 81



SEGUNDO URBANO KCAM CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP N° 31337

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Obra: NUEVA CAPILLA DE LA SEDE CENTRAL DEL MINCETUR - PRODUCE

Meta: Construcción de una Nueva Capilla

Distrito : San Isidro

Provincia : Lima

Departamento : Lima

Financiamiento : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Modalidad de Ejecución : Contrata.

Contratista : SIADEC INGENIEROS SAC.

Proceso de Selección : Adjudicación Directa Selectiva N° 045-2013-MINCETUR/CE

Contrato de Obra : N° 008-2014-MINCETUR/SG/OGA

Fecha de Firma de Contrato : 10 de Enero del 2014

Sistema : A Suma Alzada

Monto Referencial (inc IGV) : S/. 454,924.16

Monto Contratado (c/IGV 18%) : S/. 409,431.75

Monto Contratado (s/IGV 18%) : S/. 346,976.06

Fecha de Entrega de Terreno : 18 de Marzo del 2014.

Fecha de Inicio de Ejecución : 19 de Marzo del 2014.

Plazo de Ejecución : 120 días calendario.

Fecha de Término programado : 16 de Julio del 2014.

Adelanto Directo : S/. 0.00

Adelanto para Materiales : S/. 0.00

Residente de Obra : Ing. Edson K. Crucinta Gonzales

Supervisor de Obra : Ing. Segundo Urbano Kcam Chung.

Situación de la obra : en ejecución.

Ampliación de Plazo N° 01 : ninguno



SEGUNDO URBANO KCAM CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP N° 31337

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA

ANTECEDENTES

Con Resolución Directoral N° 332-2013-MINCETUR/SG/OGA del 22 de octubre 2013, se resuelve APROBAR el expediente técnico de Obra: "Nueva Capilla de la Sede Central del MINCETUR - PRODUCE" del Distrito San Isidro, de la Provincia de Lima", por la suma de S/.454,924.16, con precios referidos a octubre del 2013 y un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendario.

El expediente de contratación fue aprobado mediante Proveído N° 483-2013-MINCETUR/SG/OGA, del Memorandum N°1736-2012-MINCETUR/SG/OGA-OASA el 13 de Noviembre de 2012

Con fecha 16 de diciembre de 2013, el comité Especial adjudicó la buena pro de la Adjudicación Directa Selectiva N° 045-2013-MINCETUR/CE, para la ejecución de la obra: "Nueva Capilla de la Sede Central del MINCETUR - PRODUCE" a la empresa SIADEC INGENIEROS S.A.C., cuyos detalles, importes totales, constan en los documentos integrantes del Contrato.

Con fecha 01 de enero de 2014, se suscribe el contrato N° 008 - 2014 - MINCETUR/SG/OGA, entre el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, representada por su Directora General de Administración, Lic. Irene Suarez Quiroz y de la otra parte la empresa SIADEC INGENIEROS SAC, representado por su Gerente general, Sr. Edson Kreisler Crucinta Gonzales, para la ejecución de los trabajos, por el monto de S/ 409,431.75, con un plazo de ejecución de 120 días calendario.

Con fecha 20 de enero de 2014, se suscribe el contrato N° 013-2014-MINCETUR/SG/OGA, entre el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Ing. Segundo Urbano Kcam Chung, con RCIP N° 31337, para la Supervisión de los trabajos por el monto de S/.39,000.00, con un plazo de supervisión de 180 días calendario.

La empresa contratista NO solicita el Adelanto Directo conforme al Reglamento.

Con fecha 18 de marzo del 2014, se realiza la entrega del terreno entre el representante del MINCETUR, el Contratista y la Supervisión.

Con fecha 19 de marzo de 2014, al cumplirse los requisitos establecido en el Artículo 184° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se da inicio formal al plazo contractual de la ejecución de la obra y fecha de término el día 16 de julio del 2014.

Con Fecha 25 de marzo se presentó el Informe Inicial, luego de la Addenda realizada al contrato de Supervisión.

Con fecha 04 de Abril se presentó el Informe Mensual N° 01 correspondiente al mes de marzo del 2014, así como el Informe de Valorización Mensual N° 01 a Marzo del 2014.

Con carta N° 197-2014-MINCETUR/SG/OGA la Directora General de Administración, solicita información complementaria al Informe inicial, el mismo que se entregó el día 25 de abril con Carta N° 027-2014-SKCH/SUP, solicitándose se traslade Consultas de Obra al Proyectista para su absolución.

A la fecha la empresa contratista no presenta ante la Supervisión de obra, la solicitud de Adelanto de Materiales.


SEGUNDO URBANO KCAM CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 31337

OBJETIVO DEL PROYECTO

1.3 Objetivo del proyecto

Objetivo: Construcción de la Nueva Capilla de la sede central del MINCETUR - PRODUCE.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Consiste en: La Construcción de una Capilla, con puerta de ingreso por la playa de estacionamiento, a través del cual se ingresa a la nave central de doble altura, hacia la derecha una nave lateral, una sacristía para el párroco, una escalera caracol para acceder a una terraza desde la cual se realizarán las misas al aire libre en las festividades importantes que congregan muchos fieles.

Hacia el fondo se ha ubicado el anda del Señor de los Milagros y hacia la izquierda el altar, el sagrario y la Cruz de Luz en acero inoxidable y cristal con lámina 3M tipo arenado y en el fondo la pared calada con la cruz en cristal incoloro transparente.

TRABAJOS EJECUTADOS Y VALORIZADOS AL 30 DE ABRIL DEL 2014 (VER ANEXO)

CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIÓN

1. Valorización Bruta	51,396.40
a) Valorización	51,396.40
2.Reintegros	0.00
a) Formula Polinomica	0.00
b) Deducion Reintegro que no Corresponde por adelanto Directo	0.00
3.Deducciones	0.00
a) Amortizacion Adelanto Directo	0.00
b) Amortizacion Adelanto Materiales	0.00
4.Valorizacion Neta	51,396.40
5. IGV (18%)	9,251.35
6. TOTAL DE VALORIZACION DE OBRA N° 2	60,647.75



SEGUNDO KCAM CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP N° 31337

AVANCE DE OBRA

AVANCE FÍSICO DE LA OBRA


El avance físico de la obra se detalla a continuación:

Valorización mes de Marzo	:	4.21 %
Valorización mes de Abril	:	14.81 %
Valorización Acumulada	:	19.02 %
Saldo por valorizar	:	80.98 %

El monto de la Valorización N° 02 correspondiente al mes de Abril del 2014, equivale a **S/.60,647.75** Nuevos Soles (**SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTISIETE CON 75/100 NUEVOS SOLES**), incluido 18% de Impuesto General a las Ventas.

El avance de la obra acumulado ejecutado es de 19.02% y el programado acumulado que es de 17.45%, por tanto, la obra se encuentra con un adelanto de 1.57%, siendo un avance mayor al 80% que estipula el Reglamento; por lo que no es necesario reprogramar.

Se presenta, además, el Cuadro de Comparación de Avance Programado con el Ejecutado:

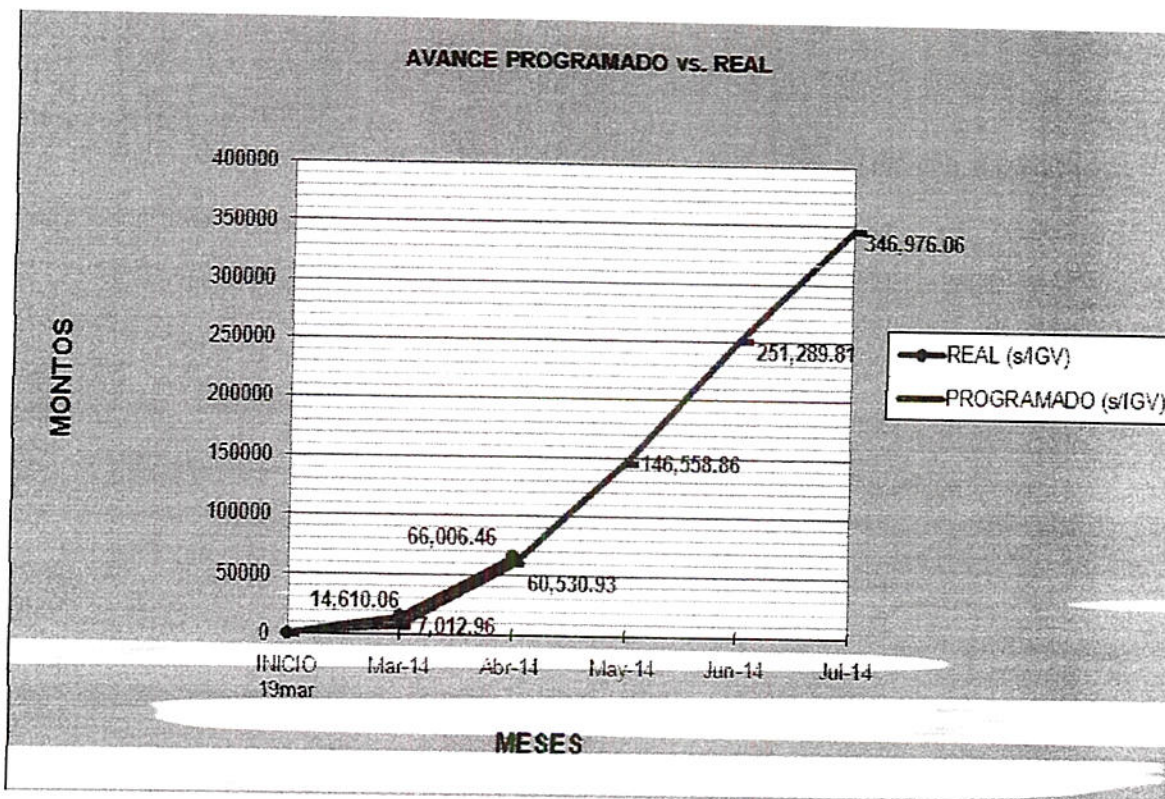

SEGUNDO URBANO KAM CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP N° 31337

AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

MONTO CONTRATADO (c/IGV)	S/. 409,431.45
VALORIZACION ACTUAL (c/IGV)	S/. 60,647.75
PORCENTAJE DE LA VALORIZACION ACTUAL	14.81%
VALORIZACION ACUMULADA (C/IGV)	S/. 77,887.62
PORCENTAJE DE VALORIZACION ACUMULADA	19.02%
AVANCE FINANCIERO	S/. 77,887.62
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	19.02%
SALDO POR VALORIZAR (s/IGV)	S/. 280,969.60
PORCENTAJE DE SALDO POR VALORIZAR	80.98%

GARANTÍAS

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

- **Carta Fianza de Fiel Cumplimiento** N° 010427582 000 emitida por el Banco Scotiabank a favor del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, por 10% del monto del Contrato que corresponde a la suma de S/.40,943.18 emitida el 02 enero del 2014 y fecha de vencimiento el 30 de junio del 2014.
- **.GARANTÍAS POR ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO PARA MATERIALES**
El contratista NO ha solicitado Adelanto Directo, NI Adelanto para Materiales

ENSAYOS DE LABORATORIO

Se adjunta resultados de ensayos de laboratorio, de las muestras o testigos de concreto obtenidas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En calidad de Supervisor de Obra se procede a remitir la Valorización N° 02, correspondiente al mes de Abril del 2,014, encontrándose conforme por ello se recomienda su cancelación respectiva, por un monto ascendente S/. 60,647.75 que corresponde a un avance físico de 14.81% y un avance acumulado de 19.02%.



SEGUNDO URBANO KCAM CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP N° 31337

Se indica que la obra se ha iniciado el 19 de Marzo y se encuentra dentro del rango de avance normal (adelantado) con respecto a lo programado,

El Supervisor realizó el procesamiento de la valorización N° 02 correspondiente al mes de abril, con los metrados revisados conjuntamente con el contratista para este periodo.

El pago de la Presente Valorización N° 02, correspondiente al mes de abril del 2014, es la suma de **S/60,647.75** incluido IGV; no se está incluyendo los reintegros por Reajuste "K"

Es todo lo que informo a usted para su conocimiento y fines.

Atentamente,



SEGUNDO XCAM CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP N° 31337

VALORIZACION DE OBRA



MINCETUR

Obra

: NUEVA CAPILLA DE LA SEDE CENTRAL DEL MINCETUR - PRODUCE*

A.D.S.

: 045-2013-MINCETUR/CE

Contratista

: SIADEC INGENIEROS SAC

Mes Valorización

: 30/04/2014

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL No. 02
(AL 30 DE ABRIL DEL 2014)

DESCRIPCION	MONTO CONTRATADO	VAL. ACUM. ANTERIOR	VALORIZACION ACTUAL	VAL. ACUM. ACTUAL	% AVANCE	SALDO DE OBRA DEDUCTIVOS
VALORIZACION CONTRACTUAL(V)						
MONTO FORMULA N°01.- ESTRUCTURAS	135,984.29	14,610.06	44,844.41	59,454.47	43.72%	76,529.82
MONTO FORMULA N°02.- ARQUITECTURA	138,150.85	0.00	2,656.86	2,656.86	1.92%	135,493.99
MONTO FORMULA N°03.- INST ELECTRICAS	51,371.19	0.00	3,895.13	3,895.13	7.58%	47,476.06
MONTO FORMULA N°04.- MOBILIARIO	21,469.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	21,469.73
TOTAL CONTRACTUAL	346,976.06	14,610.06	51,396.40	66,006.46		280,969.60
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA A LA FECHA		4.21%	14.81%	19.02%	19.02%	80.98%
REAJUSTE (S)						
REAJUSTE FORMULA N°01.-DEMOLICIONES		0.00		0.00		
REAJUSTE FORMULA N°02.-MURO DE CONTENCIÓN		0.00		0.00		
REAJUSTE FORMULA N°04.- MODULO 3 AULAS		0.00		0.00		
REAJUSTE FORMULA N°03.- ESCALERA		0.00		0.00		
TOTAL REAJUSTES		0.00	0.00	0.00		
VALORIZACION BRUTA (VB=V+S)		14,610.06	51,396.40	66,006.46		
AMORTIZACIONES						
AMORTIZACION ADELANTO EN EFECTIVO N° 01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
AMORTIZACION DE MATERIALES N° 01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
GASTOS DE LICITACION(L)						
MULTA POR ATRASO DE OBRA(M)						
MONTOS A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO(VN-FG-L-M)	346,976.06	14,610.06	51,396.40	66,006.46		280,969.60
EN I.G.V.(VN*18%)	62,455.69	2,629.81	9,251.35	11,881.16		50,574.53
MONTO TOTAL CON I.G.V.	409,431.75	17,239.87	60,647.75	77,887.62		331,544.13
TOTAL VALORIZACION N° 02	409,431.75	17,239.87	60,647.75	77,887.62		331,544.13
CARTA FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO	40,943.18		0.00			40,943.18
TOTAL A CANCELAR AL EJECUTOR			60,647.75			

EDSON KREISLER CRUCINTA GONZALES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 58611



SEGUNDO BERNARDINO KAN CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP N° 31337

GENERALIDADES

1 OBRA

: NUEVA CAPILLA DE LA SEDE CENTRAL DEL MINCETUR -
PRODUCE"

3 Ubicación : Departamento

Provincia

Distrito

Area Geografica

:Lima
:Lima
:San Isidro
: 2

4 Contratista

SIADEC INGENIEROS SAC

5 Ing. Residente

: Ing. Edson K. Crucinta Gonzales - CIP N° 58611

6 Ing. Supervisor

: Ing. Segundo Urbano Kcam Chung - CIP N° 31337

7 Adjudicación Directa Selectiva

: 045-2013-MINCETUR/CE

8 Contrato de Obra

: 008-2014-MINCETUR/SG/OGA - 10 ENE 2014

9 Modalidad

A Suma Alzada

10 Presupuesto Referencial, con IGV y Fecha

S/. 454,924.16 31-Oct-13

11 Presupuesto Referencial, sin IGV

S/. 385,528.95 31-Oct-13

12 Contrato No. y fecha

008-2014-MINCETUR/SG/OGA del 10ene2014

13 Monto del contrato, con IGV

S/. 409,431.75

14 Monto del contrato, sin IGV

S/. 346,976.06

15 Plazo de ejecución, en d. n.

120 d.n.

16 Plazo de ejecución según Bases Lic., en d.c.

120 d.n.

15 Adelanto directo sin IGV

n/s

16 Fecha de pago de adelanto en efectivo.

n/s

17 Entrega del terreno

18-Mar-14

18 Inicio oficial del plazo

19-Mar-14

19 Adelantos para materiales N°01 (s/IGV)

n/s

20 Fecha de pago adelanto materiales

n/s

21 Término original programado de obra

16-Jul-14

22 Término vigente programado de obra

16-Jul-14

23 Término real obra, según Supervisor

24 Acta recepción de obra



EDSON KREISLER CRUCINTA GONZALES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 58611



SEGUNDO URBANO KCAM CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP N° 31337

1 : NUEVA CAPILLA DE LA SEDE CENTRAL DEL MINCETUR - PRODUCE

3 01 : ESTRUCTURAS

CONTRATISTA : SIADEC INGENIEROS SAC

SUPERVISOR : Ing. Segundo Urbano Kcam Chung - CIP N° 31337

VALORIZACION DE OBRA N° : 2

Mes : 30/04/2014

Descripción Partidas	Und	Metrado Base	Precio Unitario	Parcial	VAL. ACUM. ANTERIOR		VAL. ACTUAL		VAL. ACUMULADA ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
					METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	%
ESTRUCTURAS												
OBRA PROVISIONALES												
CASETA ADICIONAL PIGUARDIA Y/O DEPOSITO Y OFICINA	M2	9.00	171.73	1,545.57	9.00	1,545.57	0.00	0.00	9.00	1,545.57	0.00	0.00%
CISTERNA DE AGUA PARA LA OBRA	GLB	1.00	900.00	900.00	0.30	270.00	0.30	270.00	0.60	540.00	0.40	40.00%
CERCO DE SEGURIDAD H=2.40 M	GLB	100.00	8.45	845.00	100.00	845.00	0.00	0.00	100.00	845.00	0.00	0.00%
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1.00	2000.00	2,000.00	0.30	600.00	0.30	600.00	0.60	1,200.00	0.40	40.00%
SERVICIOS HIGIENICOS	GLB	1.00	300.00	300.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00%
OBRA PRELIMINARES												
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	124.00	4.20	520.80	37.20	156.24	25.00	105.00	62.20	261.24	61.80	49.84%
TRAZO Y REPLANTEO	M2	124.00	1.40	173.60	37.20	52.08	45.00	63.00	82.20	115.08	41.80	33.71%
MOVIMIENTO DE TIERRAS												
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS H=1.70 M, MATERIAL SUELTO	M3	48.85	29.58	1,444.98	48.85	1,444.98	0.00	0.00	48.85	1,444.98	0.00	0.00%
EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS H=1.00 M, MATERIAL SUELTO	M3	2.02	33.80	68.28	2.02	68.28	0.00	0.00	2.02	68.28	0.00	0.00%
ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	M3	48.85	14.79	722.49	48.85	722.49	0.00	0.00	48.85	722.49	0.00	0.00%
ELIMINACION DE MATERIAL PROV. DE EXCAVACIONES CARGA MANUAL	M3	45.61	24.54	1,119.27	45.61	1,119.27	0.00	0.00	45.61	1,119.27	0.00	0.00%
CAVLOQUETE 8 M3												
CONCRETO SIMPLE												
CIMENTOS												
CIMENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G. Fc >= 100 KG/cm2	M3	13.06	157.80	2,060.87	13.06	2,060.87	0.00	0.00	13.06	2,060.87	0.00	0.00%
SOLADOS												
SOLADOS PARA ZAPATAS e=4", 1:12 CEM/HORM	M2	21.34	30.05	641.27	21.34	641.27	0.00	0.00	21.34	641.27	0.00	0.00%
FALSO PISO												
FALSO PISO MEZCLA 1:10 e=4"	M2	123.27	26.71	3,292.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.27	100.00%
CONCRETO ARMADO												
ZAPATAS												
ZAPATAS - CONCRETO 210 KG/CM2	M3	1.83	261.92	478.31	0.00	0.00	1.83	478.31	1.83	478.31	0.00	0.00%
ZAPATAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	0.38	55.12	20.95	0.00	0.00	0.38	20.95	0.38	20.95	0.00	0.00%
ZAPATAS - ACERO Fy=4200 KG/CM2	KG	26.14	4.06	106.13	0.00	0.00	26.14	106.13	26.14	106.13	0.00	0.00%
PLACAS Y COLUMNAS												
PLACAS - CONCRETO Fc=210 KG/CM2 - 1 PISO (PREMEZCLADO CON BOMBA)	M3	26.11	299.87	7,829.61	0.00	0.00	26.11	7,829.61	26.11	7,829.61	0.00	0.00%
PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	285.60	50.64	14,462.78	0.00	0.00	285.60	14,462.78	285.60	14,462.78	0.00	0.00%
PLACAS - ACERO Fy=4200 KG/CM2	KG	1873.38	4.06	7,605.92	911.77	3,701.79	961.61	3,904.14	1,873.38	7,605.92	0.00	0.00%
VIGAS												
VIGAS - CONCRETO 210 KG/CM2 - 1 PISO	M3	0.92	300.18	276.17	0.00	0.00	0.92	276.17	0.92	276.17	0.00	0.00%
VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	5.44	58.93	320.58	0.00	0.00	5.44	320.58	5.44	320.58	0.00	0.00%
VIGAS - ACERO Fy=4200 KG/CM2	KG	130.63	4.06	530.36	0.00	0.00	130.63	530.36	130.63	530.36	0.00	0.00%

SEGUNDO URBANO KCAM CHUNG

INGENIERO CIVIL

CIP N° 31337



EDSON KREISLER CRUCINTA GONZALES

INGENIERO CIVIL

Reg. CIP N° 58611



a 01 : ESTRUCTURAS

CONTRATISTA **SIADec INGENIEROS SAC**

SUPERVISOR : Ing. Segundo Urbano Kcam Chuna - CIP N° 31337

Mes : 30/04/2014

VALORIZACION DE OBRA N° : 2

2

Mes : 30/04/2014													
Descripción Partidas		Und	Metrado Base	Precio Unitario	Parcial	VAL. ACUM. ANTERIOR		VAL. ACTUAL		VAL. ACUMULADA ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
						METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO
1	LOSAS MACIZAS												
01	LOSAS MACIZAS - CONC. 210 KGCM2	M3	3.62	300.18	1,086.65	0.00	0.00	3.62	1,086.65	3.62	1,086.65	0.00	0.00
02	LOSAS MACIZAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	18.11	51.79	937.92	0.00	0.00	18.11	937.92	18.11	937.92	0.00	0.00
03	LOSAS MACIZAS - ACERO Fy=4200 KGCM2	KG	444.67	4.06	1,805.36	0.00	0.00	444.67	1,805.36	444.67	1,805.36	0.00	0.00
	ESTRUCTURAS METALICAS Y COBERTURA COLUMNAS												
01	COLUMNAS METALICA TIPO C-01 SEGÚN DISEÑO	ML	21.12	221.33	4,674.49	0.00	0.00	21.12	4,674.49	21.12	4,674.49	0.00	0.00
02	COLUMNAS METALICA TIPO C-02 SEGÚN DISEÑO	ML	36.20	235.09	8,510.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.20	8,510.26
03	COLUMNAS METALICA TIPO C-03 SEGÚN DISEÑO	ML	6.60	235.09	1,551.59	0.00	0.00	6.60	1,551.59	6.60	1,551.59	0.00	0.00
04	MONTAJE DE COLUMNAS	GLB	1.00	138.50	138.50	0.00	0.00	0.30	41.55	0.30	41.55	0.70	96.95
	TIRANTES												
01	TIRANTE METALICO	ML	116.72	120.00	14,006.40	0.00	0.00	2.00	240.00	2.00	240.00	114.72	13,766.40
02	MONTAJE DE TIRANTE	GLB	1.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.15	21.00	0.15	21.00	0.85	119.00
	VIGAS												
01	PERFIL TR 6" X 6" X 3/16"	ML	91.54	78.60	7,195.04	0.00	0.00	27.46	2,158.51	27.46	2,158.51	64.08	5,036.53
02	PERFIL TR 6" X 2" X 3/16"	ML	75.34	88.00	6,629.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.34	6,629.92
03	MONTAJE DE PERFILES	GLB	1.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.30	37.50	0.30	37.50	0.70	87.50
	VIGUETAS												
01	VIGUETA V - 1/4" X 2" X 1/8"	ML	105.87	145.00	15,351.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.87	15,351.15
02	MONTAJE DE VIGUETA	GLB	1.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	135.00
	TENSORES												
01	TENSORES % C 1/2"	ML	82.55	115.00	9,493.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.55	9,493.25
02	MONTAJE DE TENSORES	GLB	1.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	145.00
	TECHO												
01	COBERTURA PLANCHA SUPERBOARD EP=20MMI	M2	113.18	57.16	6,469.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.18	6,469.37
01.01	COBERTURA PLANCHA DE FIBRACIMENTO 1.10 X 2.44	GLB	1.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	250.00
01.02	INSTALACION DE PLANCHAS												
	COSTO DIRECTO				125,911.38		13,527.84		41,522.60		55,050.44		70,860.94
	GASTOS GENERALES	10.0%			12,591.14		1,352.78		4,152.26		5,505.04		7,086.10
	UTILIDADES	10.0%			12,591.14		1,352.78		4,152.26		5,505.04		7,086.10
	SUB TOTAL				151,083.66		16,233.40		49,827.12		66,080.52		85,033.14
	SUB TOTAL x FR	0.9			135,984.29		14,610.06		44,844.41		59,454.47		76,623.82

EDSON KREISLER CRUCINTA GONZALES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 58611



SEGUINDO ORDEN DE KICHI CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP N° 31337

02 : ARQUITECTURA

02 : ARQUITECTURA

VALORIZACION DE OBRA N° : 2 Mes : 30/04/2014

CONTRATISTA : SIADEC INGENIEROS SAC

SUPERVISOR : Ing. Segundo Urbano Kcam Chung - CIP N° 31337

Descripción Partidas	Und	Metrado Base	Precio Unitario	Parcial	VAL. ACUM. ANTERIOR		VAL. ACTUAL		VAL. ACUMULADA ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
					METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO
ARQUITECTURA												
MUROS Y TABIQUERIA	M2	42.70	149.73	6,393.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.70	6,393.47
TABIQUERIA DRYWALL ACUSTICO CON SUPERBOARD e=8MM, CON LANA												
CIELOS RASOS	M2	126.50	104.41	13,207.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.50	13,207.86
PLANCHAS SUPERBOARD EP e=20MM EN TECHOS												
PISOS Y PAVIMENTOS												
CONTRAPIESOS	M2	138.50	23.66	3,275.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.50	3,275.52
CONTRAPISO 1.5, ACABADO 1/2 e=40MM												
PISOS	M2	133.68	76.78	10,263.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.68	10,263.95
PISO PORCELANATO PULIDO BRILLANTE RECTIFICADO 0.60 X 0.60 M2												
PISO CEMENTO PULIDO	M2	4.85	36.33	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85	176.20
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS												
CONTRAZOCALOS												
CONTRAZOCALO DE PORCELANATO BRILLANTE RECTIFICADO COLOR B	ML	70.67	15.97	1,128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.67	1,128.60
CONTRAZOCALO DE PORCELANATO BRILLANTE RECTIFICADO COLOR B	ML	9.70	16.28	157.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70	157.92
CARPINTERIA METALICA												
PUERTA METALICA SEGUN DISEÑO	M2	25.94	158.06	4,100.08	0.00	0.00	15.56	2,460.05	15.56	0.00	10.38	1,640.03
ESCALERA METALICA PASOS DE METAL PERFORADA H=6 CM Y COLUMN	ML	8.50	137.35	1,167.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	1,167.48
CORTASOL PERFIL DE ALUMINIO DE 2 1/2" X 6"	ML	166.33	16.78	2,791.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.33	2,791.02
CARPINTERIA DE MADERA												
PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA	M2	3.45	388.34	1,339.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	1,339.77
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES												
CRISTAL TEMPLADO e=10mm INCLUIDO ACCESORIO	M2	162.72	260.00	40,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.72	40,680.00
CRISTAL TEMPLADO e=6mm INCLUIDO ACCESORIO	M2	72.40	240.00	17,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.40	17,376.00
CERRAJERIA												
BISAGRAS												
BISAGRAS ALUMINIZADA DE 4" X 4" EN PUERTAS	UND	8.00	3.73	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	29.84
CERRADURAS												
CERRADURA TIPO PESADA 2 GOLPES	UND	2.00	52.66	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	105.12
CERRADURA PARA PUERTA METALICA	UND	1.00	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	44.57
PINTURAS												
PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO	M2	145.96	8.73	1,274.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.96	1,274.23
PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES	M2	42.70	8.52	363.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.70	363.80
PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES	M2	42.70	8.52	363.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.70	363.80
PINTURA LATEX 2 MANOS EN DERRAMES	M2	14.84	7.09	105.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84	105.22

EDSON KREISLER CRUCINTA GONZALES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 58611

INGENIERO JEFE DE OBRA
SEGUNDO URBANO KCAM CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP N° 31337

LA NUEVA CAPILLA DE LA SEDE CENTRAL DEL MINCETUR - PRODUCE"

CONTRATISTA SIADEC INGENIEROS SAC

02 ; ARQUITECTURA

SUPERVISOR : Ing. Segundo Urbano Kcam Chung - CIP N° 31337

VALORIZACION DE OBRA N° : 2 Mes : 30/04/2014

2

Mes

: 30/04/2014

Descripción Partidas	Und	Metrado Base	Precio Unitario	Parcial	VAL. ACUM. ANTERIOR		VAL. ACTUAL		VAL. ACUMULADA ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR			
					METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO		
													%	
COBERTURA MANTO ASFALTICO CON RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO PLATINA DE ALUMINIO PARA LLUVIAS e=0.18 CM OTROS MESA DE CONCRETO SEGÚN DISEÑO ALTAR DE MARMOL SEGÚN DISEÑO ANDA E IMAGEN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS LETRA DE PLANCHA ZINCADA PINTADA CON TITANIO CRUZ DE MADERA Y ESCULTURA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS SEGÚN DISEÑO	M2	126.50	125.00	15,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	126.50	15,812.50	100.00%	
	ML	45.30	85.00	3,850.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45.30	3,850.50	100.00%	
	M2	4.00	350	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4.00	1,400.00	100.00%	
	M2	3.00	380	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3.00	1,140.00	100.00%	
	UND	1.00	450	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	450.00	100.00%	
	UND	2.00	250	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.00	500.00	100.00%	
	UND	1.00	420	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	420.00	100.00%	
	COSTO DIRECTO				127,917.45			2,460.05					125,457.40	
	GASTOS GENERALES	10.0%			12,791.75	0.00	0.00	246.01	2,460.05				12,545.74	
UTILIDADES	10.0%			12,791.75	0.00	0.00	246.01	246.01				12,545.74		
SUB TOTAL				153,500.95	0.00	0.00		2,952.07	2,952.07			150,548.88		
SUB TOTAL x FR	0.9			138,150.86				2,656.86	2,656.86	1.92%		135,494.00		

EDSON KREISLER CRUCINTA GONZALES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 58611



INGENIERO CIVIL
CIP N° 31337

INCETUR			BRA : NUEVA CAPILLA DE LA SEDE CENTRAL DEL MINCETUR - PRODUCE*			CONTRATISTA : SIADEC INGENIEROS SAC			SUPERVISOR : Ing. Segundo Urbano Kean Chung - CIP N° 31337		
Xmula 03 : INSTALACIONES ELECTRICAS			VALORIZACION DE OBRA N° : 2			Mes : 30/04/2014					
em	Descripción Partidas	Und	Metrado Base	Precio Unitario	Parcial	VAL ACUM. ANTERIOR	VAL. ACTUAL	VAL ACUMULADA ACTUAL	SALDO POR VALORIZAR		
						METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	%
3	INSTALACIONES ELECTRICAS										
3.01	SALIDAS										
3.01.01	SALIDA PARA LUZ EN TECHO	UND	1.00	132.82	132.82	0.00	1.00	1.00	132.82	100.00%	0.00%
3.01.02	SALIDA PARA LUZ EN FALSO TECHO	UND	8.00	121.87	974.96	0.00	8.00	6.00	731.22	75.00%	25.00%
3.01.03	SALIDA PARA LUZ EN PARED INTERIOR	UND	4.00	139.39	557.56	0.00	2.00	2.00	278.78	50.00%	50.00%
3.01.04	SALIDA PARA LUZ EN PARED EXTERIOR	UND	2.00	152.04	304.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
3.02	INTERRUPTORES										
3.02.01	SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR DOBLE	PTO	1.00	216.86	216.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
3.02.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE COMUNICACIÓN DOBLE	PTO	2.00	211.86	423.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
3.03	TOMACORRIENTES										
3.03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA	PTO	10.00	198.76	1,987.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
3.05	TABLEROS										
3.05.01	TABLERO DISTRIBUCION (TD) DE ACUERDO DIAGRAMA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	ML	1.00	618.45	618.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
3.06	TUBERIAS										
3.06.01	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CONDUIT DE Ø 35 MM	ML	25.00	106.16	2,654.00	0.00	18.75	18.75	1,990.50	75.00%	25.00%
3.13.01	TUBERIA PVC-P Ø 25MM	ML	25.00	34.42	860.50	0.00	13.75	13.75	473.28	55.00%	45.00%
3.07	CONDUCTORES Y/O CABLES										
3.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CABLE NYHX90 3 - 1 X 10 MM2 + 1 X 10	ML	25.00	113.07	2,826.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
3.08	CAJA DE FASE										
3.08.01	CAJA DE FOGO DE 100X50MM	UND	2.00	102.96	205.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
3.12.01	CAJA DE FOGO DE 150 X 75MM	UND	2.00	84.14	168.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
3.09	EQUIPO DE ILUMINACION										
3.09.01	LUMINARIA TIPO L-01 WALL WASHER LED BLANCO 12x1.1W CLD S+L (MODELO ACOSTA O SIMILAR)	UND	7.00	2,839.20	19,874.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
3.09.02	LUMINARIA TIPO L-02 WALL WASHER LED BLANCO 6x1.1W CLD S+L (MODELO ACOSTA O SIMILAR)	UND	1.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
3.09.03	LUMINARIA TIPO L-03 LED BLANCO 18.2W CLD CELL (MODELO MINISHOP)	UND	1.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
3.09.04	LUMINARIA TIPO L-04 TIRA LED X 4 EMPOTRABLE 17W CLD CELL (MODELO ACOSTA O SIMILAR)	UND	8.00	864.80	7,078.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
3.10	SALIDAS DE SEGURIDAD										
3.10.01	SALIDA PARA SENSOR DE HUMO	UND	3.00	308.98	926.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
3.10.02	SALIDA PARA SENSOR DE TEMPERATURA	UND	3.00	301.87	905.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
3.10.03	SALIDA PARA SIRENA (ALARMA CONTRA INCENDIO)	UND	1.00	308.98	308.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
3.10.04	SALIDA PARA ACTIVADOR MANUAL DEL ALARMA	UND	1.00	308.34	308.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
3.11	SALIDAS PARA COMUNICACIONES										
3.11.01	SALIDA PARA EQUIPO DE SONIDO	UND	1.00	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
3.11.02	SALIDA PARA PARLANTES	UND	4.00	75.83	303.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
3.14	PRUEBAS										
3.14.01	PRUEBAS ELECTRICAS	GLB	1.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
	COSTO DIRECTO				47,565.92		3,606.80		3,606.80		
	GASTOS GENERALES	10.0%			4,756.59		360.66		360.66		
	UTILIDADES	10.0%			4,756.59		360.66		360.66		
	SUB TOTAL				57,079.10		4,327.92		4,327.92		
	SUB TOTAL x FR	0.9			51,371.19		3,895.13	7.56%	2,500.00		
									43,959.32		
									4,395.93		
									4,395.93		
									52,751.18		
									47,476.06		

EDSON KREISLER CRUCINTA GONZALES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 58611

SEGUNDO URBANO KEAN CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP N° 31337



MINCETUR

CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA (ADECUADO A LA FECHA DE INICIO)

Obra:

: NUEVA CAPILLA DE LA SEDE CENTRAL DEL MINCETUR - PRODUCE"

A.D.S N° : 045-2013-MINCETUR/CE
Contratista SIADEC INGENIEROS SAC

Presupuesto Referencial : 454,924.16
Presupuesto contratado: 409,431.74
Presup. Contratado s/IGV: 346,976.05
Fecha de Inicio: 19-Mar-14
Plazo de ejecución en d.n. 120
Ampliacion de plazo 0
Fin de Obra: 16-Jul-14
F.R. 0.90000

FORMULA c/F.R.	Total Contrato	13 dias 19/03 a 31/03	30 dias 01/04 a 30/04	31 dias 01/05 a 31/05	30 dias 01/06 a 30/06	16 dias 01/07 a 16/07	Total Valorizado
01 ESTRUCTURAS	135,984.29						135,984.29
02 ARQUITECTURA	138,150.85						138,150.85
03 INSTALACIONES ELECTRICAS	51,371.19						51,371.19
04 MOBILIARIO	21,469.73						21,469.73
SUB TOTAL	346,976.06	7,012.96	53,517.97	86,027.93	104,730.95	95,686.25	346,976.06
IGV 18%	62,455.69	1,262.33	9,633.23	15,485.03	18,851.57	17,223.53	62,455.69
MONTOS FECHADOS (C/IGV)	409,431.75	8,275.29	63,151.20	101,512.96	123,582.52	112,909.78	409,431.75
PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL		2.02%	15.42%	24.79%	30.18%	27.58%	100.00%
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO		2.02%	17.45%	42.24%	72.42%	100.00%	

EDSON KREISLER CRUCINTA GONZALES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 58611




SECCION URBANISMO Y CAMINOS
INGENIERO CIVIL
CIP N° 31337

AVANCE PROGRAMADO Vs. EJECUTADO

VALORIZACIÓN N° 02

MES	AVANCE MENSUAL						SITUACIÓN DE LA OBRA.
	PROGRAMADO (s/IGV)			REAL (s/IGV)			
	MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO		
	Soles	Soles	%	Soles	Soles	%	
INICIO 19mar	0	0	0	0	0		
Mar-14	7,012.96	7,012.96	2.02%	14,610.06	14,610.06	4.21%	Adelantado Adelantado
Abr-14	53,517.97	60,530.93	17.45%	51,396.40	66,006.46	19.02%	
May-14	86,027.93	146,558.86	42.24%				
Jun-14	104,730.95	251,289.81	72.42%				
Jul-14	95,686.25	346,976.06	100.00%				
		346,976.06			66,006.46		

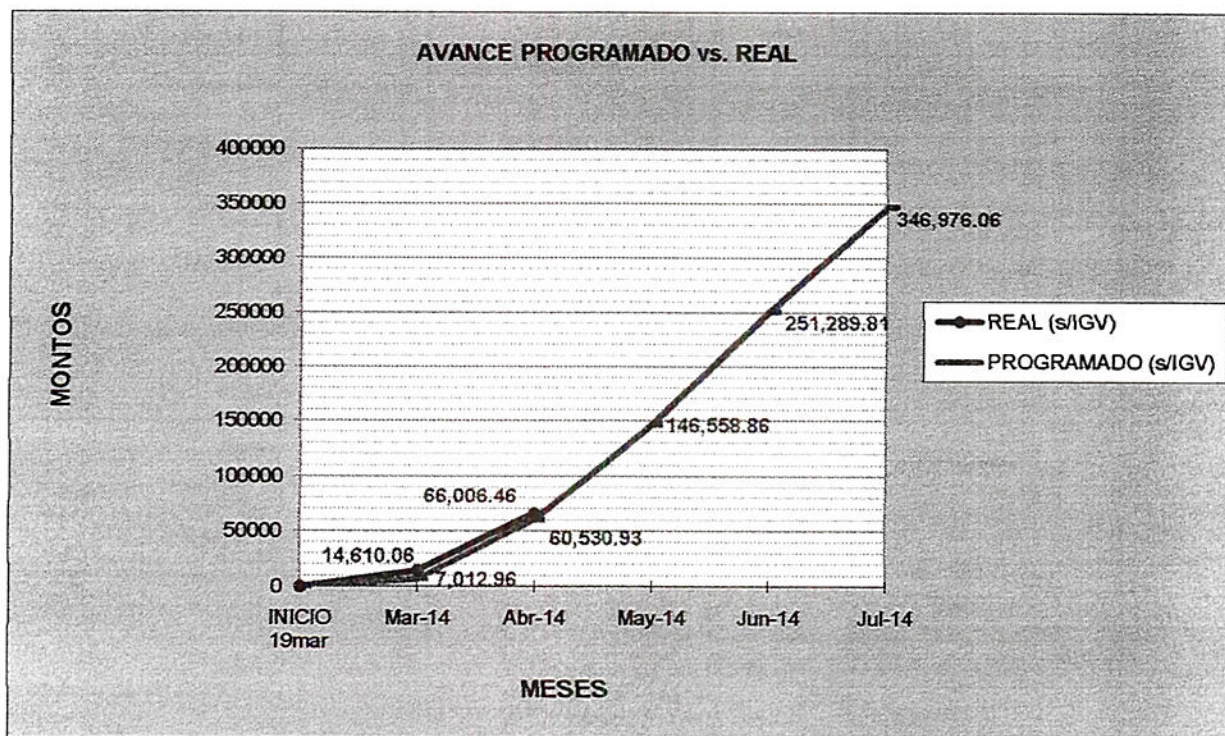


SEGUNDO LIBANO KCAN GHUNG
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 31337
